



ESOŠO KOMUNIKĀCIJU AIZSARDZĪBA


Šķērsojošo inženiertīklu aizsardzība būvgrāvī

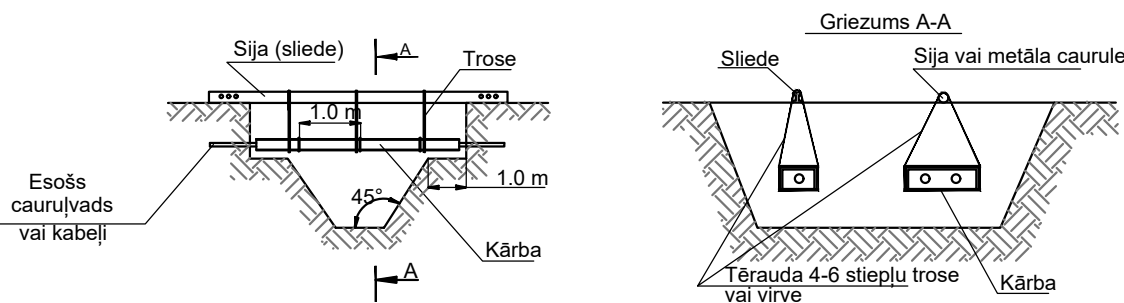


Koka kārba inženiertīklu nostiprināšanai un aizsardzībai

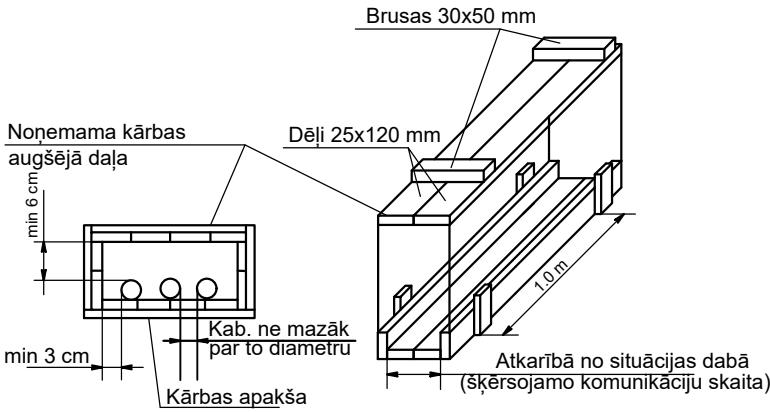

Paralēli izvietoto inženiertīklu aizsardzība

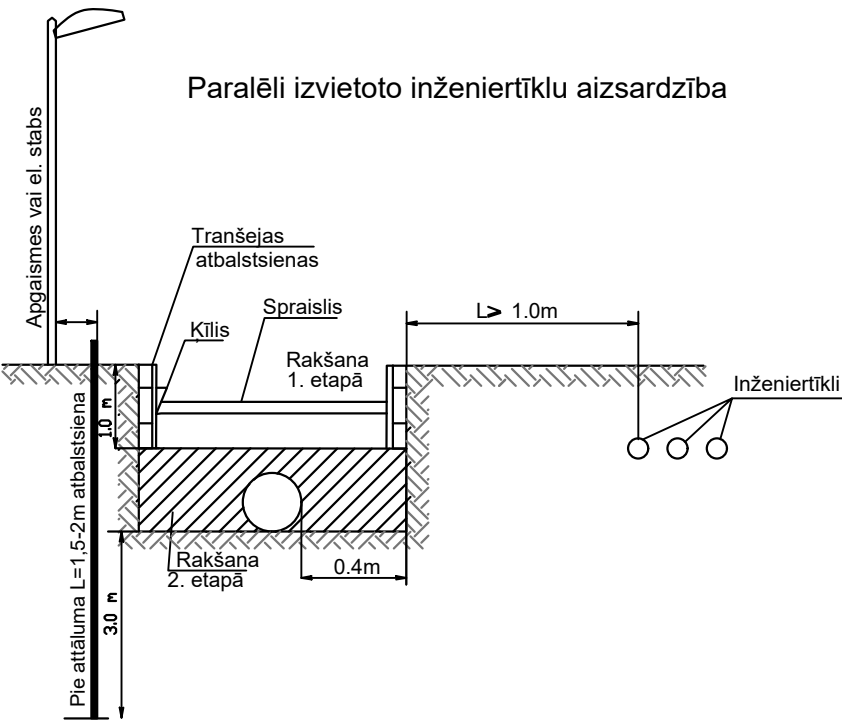

Paralēli izvietoto inženiertīklu aizsardzība

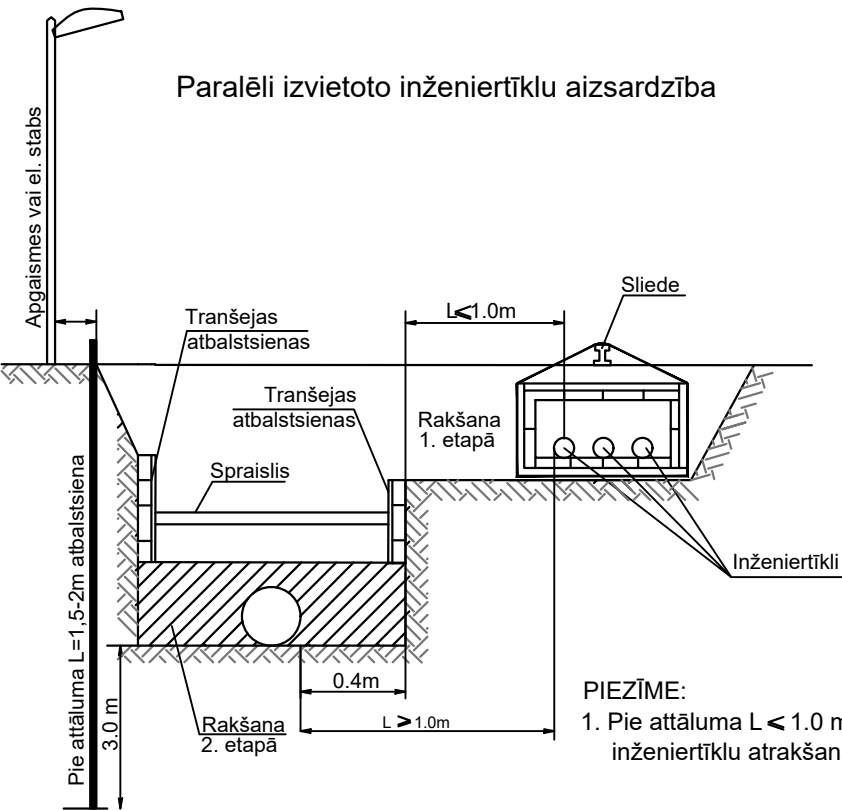

BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA INŽENIERTĪKLU ZONĀ

1. Rakšanas darbus veikt pa posmiem. Posma garums nepārsniedzot 10m.
2. Elektrības un sakaru kabeļu aizsardzības joslā darbus veikt nepielietojot mehānismus.
3. Pirms rakšanas darbu uzsākšanas atrakts un nostiprināt aizsargkonstrukcijā esošos inženiertīklus.
4. Pēc cauruļvada izbūves veikt tranšejas aizbēršanu un inženiertīklu aizsargkonstrukcijas pārvietošanu uz nākamo posmu.
5. Jāievēro iesaistīto institūciju tehniskajos noteikumos noteiktais, ja ir prasība (piemēram elektrības un sakaru kabeļiem) jāuzstāda paliekošas aizsargčaulas 750 N.
6. Veicot darbus ar celšanas mehānismiem 30 m joslā no gaisvadu elektrolīnijas malējā vada ievērot MK noteikumus Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika".

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS: EL Ekolat Sia Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R 1.Preču 30a, Daugavpils, LV-5401 tāl.65424646, ekolat@inbox.lv				PASŪTĪTĀJS: valmieras ūdens SIA "Valmieras ūdens" REĢ. NR. 44103033608, RŪPNIECĪBAS IELA 50, VALMIERA LV-4201		
AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	PROJEKTS: Ūdensvada un kanalizācijas pārbūve daudzdzīvokļu māju Viestura laukums 5, 7 un 8 zemes gabalos, Valmiermuižā, Valmieras novadā	PASŪTĪJUMA NUMURS:	2-1/2023/67
BŪVPR.D.VAD.	T.Loginova		03.2024.		STADIJA:	BP
IZSTRĀDĀJA	N.Zīle		03.2024.	RASĒJUMS: Esošo inženiertīklu aizsardzība	MARKA:	UKT
					LAPAS NR.:	6
				FAILS:	KOPEJO LAPU SKAITS:	10
					MĒROGS:	-
					ARHĪVA REĢ. NUMURS:	
